



## BITACORA DE TRABAJOS REALIZADOS

### “POZO LA CENTRAL”



Siendo las 13:00 horas del día 25 de Noviembre del presente se comenzó con la extracción del equipo de bombeo para su mantenimiento correctivo, mismo que se llevo a reparar a los talleres del proveedor quedan el pozo fuera de servicio mientras es reparado el equipo..

Hoy 28 de Noviembre siendo las 14:00 se Reanuda el trabajo para ingresar el equipo de bombeo ya reparado por el proveedor para dar continuidad al servicio básico de agua potable siendo las 15:30 del día en curso se terminan los trabajos en el pozo.

**Acción:** Mantenimiento de equipo de bombeo en el pozo San Miguel.

**Localización:** Prolongación Hidalgo #1900.

**Propósito:** Mantener en buenas condiciones el equipo de bombeo para dar un mejor servicio de agua potable.

**Beneficiados:** Habitantes de los barrio de La Cruz, El Nejayote, Las Crucitas, Centro y Tavares.















<b>Firma: Contralor Municipal</b>	<b>Firma: Director</b>	<b>Folio CFDI 002116E</b>
-----------------------------------	------------------------	-------------------------------



## BITACORA DE TRABAJOS REALIZADOS

### “POZO SAN MIGUEL



Siendo las 11:00 horas del día 21 de Noviembre del presente se comenzó con la extracción del equipo de bombeo para su mantenimiento correctivo, mismo que se llevo a reparar a los talleres del proveedor quedan el pozo fuera de servicio mientras es reparado el equipo..

Hoy 26 de Noviembre siendo las 13:00 se Reanuda el trabajo para ingresar el equipo de bombeo ya reparado por el proveedor para dar continuidad al servicio básico de agua potable siendo las 16:30 del día en curso se terminan los trabajos en el pozo.

**Acción:** Mantenimiento de equipo de bombeo en el pozo San Miguel.

**Localización:** calle Gladiola esq. Calle López Cotilla # 500, Col. Bella vista.

**Propósito:** Mantener en buenas condiciones el equipo de bombeo para dar un mejor servicio de agua potable.

**Beneficiados:** Habitantes de los barrio de San Miguel; Bella Vista y El Tanque.















<b>Firma: Contralor Municipal</b>	<b>Firma: Director</b>	<b>Folio CFDI 002117E</b>
-----------------------------------	------------------------	-------------------------------



# TEOCALTICHE

H. AYUNTAMIENTO

2024 - 2027

## **REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA DEL 01 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024.**

- Reparación de tres fugas de agua en calle, 2 de Abril # 271, Jacarandas # 69, Victoriano Salado Álvarez # 79.
- Se destapo toma de agua en calle Panteón Municipal, La Rosa # 188, Gladiola esquina Niños Heroes, Gladiola frente al Pozo, Jacarandas # 69, Av. Jalisco # 58, Niños Heroes esquina Libramiento sur, La Rosa esquina Begonia.
- Se destapo Drenaje en calle La Rosa # 135, La Rosa 102, Doroteo Arango 22.
- Se conecto Contrato de Agua en calle Jardines del Sur # 7, La Trinidad en calle Rio Chico # 64, Doroteo Arango # 22, Begonia # 4.
- Se modifiko padrón de usuarios en tres contrato C-1000419, C-1003068, C-1004228.
- Se Genero descuento en tres contratos, C-1009197, C-1002043, C-1003437.





# TEOCALTICHE

H. AYUNTAMIENTO

2024 - 2027

## REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA DEL 08 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

- Reparación de tres fugas de agua en calle, Cuauhtémoc # 72-A, Donato Guerra # 52, San Angel # 18.
- Se destapo toma de agua en calle, La Rosa # 188, Niños Heroes # 731, Niños Heroes # 736, Niños Heroes # 734.
- Se destapo Drenaje en calle, Moctezuma Sur # 307, Escobeteros # 18.
- Se sondeo tubería en Arroyo del Jaloco
- Se instalo llave de paso y bastón en Libramiento Carretero Sur # 1035.
- Se Modifico toma en calle Niños Heroes en el Panteón Municipal.
- Se instalo llave de paso en el Rincón Musical.
- Se conecto Contrato de Agua en calle, Libramiento Carretero Sur # 1035.
- Se realizo contrato de Agua y Drenaje en calle, Pv. 5 de Febrero # 44, Loma Verde # 8.
- Se realizo contrato de Agua en calle Analco # 152.
- Se genero descuento del 50 % a persona Mayor en C-1008559.



# TEOCALTICHE

H. AYUNTAMIENTO

2024 - 2027

## REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA DEL 15 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

- Reparación de nueve fugas de agua en calle, José G Laris # 380, Venustiano Carranza, Central Nueva, Cerro de los Gregorios, Torneros # 8, Guadalupe Victoria # 125, Niños Heroes # 1045, Juan A García # 279, Lerdo # 175.
- Se destapo toma de agua en calle, Niños Heroes # 775, Av. Jalisco # 50, Gladiola # 45.
- Se destapo drenaje en calle Uruguay # 10.
- Se conecto Contrato de Agua y Drenaje, Pensador Mexicano # 5-A, Loma Verde # 8, 5 de Febrero # 44.
- Se cambio llave de paso Victoriano Salado Álvarez # 77, La Cruz # 1
- Se sondeo drenaje en calle Constitucion # 219.
- Se arreglo Tuberia 12 “, en Arroyo del Jaloco
- Se modifiko padrón de usuarios en un contrato C-1001290
- Se elaboro contrato de agua y drenaje en calle Aguascalientes # 29.
- Se Genero descuento del 50% a persona Mayor en C-1008559.
- Se Cancelo contrato en contrato C-1004521.





# TEOCALTICHE

H. AYUNTAMIENTO

2024 - 2027

## REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA DEL 22 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

- Reparación de catorce fugas de agua en calle, Constitucionalistas # 74, Loma Alta # 10, Justo Sierra # 268, Manuel Doblado # 5, Pablo A Ramirez # 308, Gil Mendoza # 64, Justo Sierra # 176, La Rosa Oriente # 24, Constitución # 219, Torneros # 16, Uruguay # 25, Matamoros # 117, Ignacio Ramirez # 14, Ignacio L Vallarta # 21.
- Se destapo toma de agua en calle, La Rosa # 140, La Rosa # 149, Gladiola # 52, La Rosa # 178, Cerro de los Gregorios # 123, Callejón Galeana # 20.
- Se reconecto Toma que estaba suspendida en calle Loma Verde # 8
- Se destapo drenaje en calle, Lázaro Cárdenas # 33, Constitución.
- Se conecto Contrato de Drenaje en calle Caballitos # 54, Cuauhtémoc # 225.
- Se suspendió servicio de agua, calle José G Laris # 17, tiradero de agua y es casa sola.
- Se modifico toma tapada en calle Niños Heroes # 22 en comunidad de Rancho Nuevo.
- Se arreglo Tubería 1 tramo 3" en Calera, 2 coples de reparación, 1 abrazadera Hidráulica.
- Se modifico padrón de usuarios en tres contrato. C-1003134, C-1002203, C-1002203.
- Se elaboro Contrato de Drenaje en calle Caballitos # 54.
- Se elaboro Contrato de Agua en calle Vallarta # 12 en la Comunidad de Calera.
- Se Genero Descuento del 50% persona Mayor en un Contrato C-11000025.
- Se recibieron 1500 kgs. De Cloro que se distribuyeron en,
  - 500 kgs. Pozo de Calerita.
  - 250 kgs. Pozo de San Miguel.
  - 250 kgs. Pozo del Castillo.
  - 250 kgs. Planta la Cruz.
  - 250 kgs. Pozo CTM.



## BITACORA DE TRABAJOS REALIZADOS



**Acción:** Reparación de fuga en la línea de llenado Pozo San Pedro – Depósitos de la cruz.

**Localización:** Pozo San Pedro y arroyo del jaloco.

**Propósito:** Mantener en buenas condiciones la infraestructura de agua potable

**Beneficiados:** Habitantes de los barrio de La Cruz, El Nejayote, Las Crucitas, Centro, Tavares, San Pedro, San José , El Puente y los Fraccionamientos lomas de Teocaltiche, Colinas de la Cruz.









**Acción:** Sustitución de 12 metros de tubo rd-26 de 3”.

**Localización:** Calle Gladiola, fraccionamiento Maravillas..

**Propósito:** Mantener en buenas condiciones la infraestructura de agua potable

**Beneficiados:** Habitantes de la colonia Maravillas, Gobernantes, El Barrio, San Martin fraccionamientos Maravillas, Los Arcos, INFONAVIT, Santa Fe, Colinas de la Cruz.







BITACORA DE MEDICION DE CLORO LIBRE RESIDUAL

LOCALIDAD: TEOCALTICHE		PERIODO de: 04/11/2024 al 08/11/2024				FOLIO: 045	
No	PUNTO DE MUESTREO	Hora	CLORO LIBRE Mg/L	FECHA	AGUA PROVENIENTE	COMENTARIOS	
1	JOHN F. KENEDDY No 8 COL. BELLAVISTA	11:23	1.5	07/11/2024	SAN MIGUEL	EL DOSIFICADOR OPERA BIEN	
2	FILARMONICA No 19 COL. C.T.M.	11:43	1.5	07/11/2024	C.T.M.	EL DOSIFICADOR OPERA BIEN	
3	CIPRESES No 20 FRAC. ARBOLEDAS	12:12	2	07/11/2024	ARBOLEDAS	EL DOSIFICADOR OPERA BIEN	
4	TORNEROS No 22 COL. SAN PEDRO	12:40	1.5	07/11/2024	CALERITA	EL DOSIFICADOR OPERA BIEN	
5	QUINTANA ROO No 37 FRAC. LOS ANGELES	10:12	0.5	08/11/2024	CASTILLO	EL DOSIFICADOR OPERA BIEN	
6	CENTRO DE SALUD TEOCALTICHE	10:35	1	08/11/2024	LA CRUZ	EL DOSIFICADOR OPERA BIEN	
7	MERCADO MUNICIPAL	11:00	1	08/11/2024	LA CRUZ	EL DOSIFICADOR OPERA BIEN	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14						Administración 2024-2027	
15							
16							
17							
18							
Metodo DPD							
FIRMAS		OPERADOR		AUTORIZA			
C. JOSE ALEJANDRO RAMIREZ QUEZADA		ING. ADRIAN DE JESUS ALVAREZ ROMO		C. ALBERTO AVILA HERNANDEZ			
NOM-127-SSA1-2021 límites cloro libre residual 0.2 a 1.5 mg/L		TIPO DE MANTENIMIENTO / OBSERVACIONES					
FO-CC-02-22		TIPO ALBERCA					
revisión 02							
SELLO ORGANISMO OPERADOR		SELLO SSA					



BITACORA DE MEDICION DE CLORO LIBRE RESIDUAL

LOCALIDAD: TEOCALTICHE		PERIODO de: 11/11/2024 al 15/11/2024			FOLIO: 046	
No	PUNTO DE MUESTREO	Hora	CLORO LIBRE Mg/L	FECHA	AGUA PROVENIENTE	COMENTARIOS
1	LOPEZ COTILLA No 407 COL. BELLAVISTA	10:13	2	14/11/2024	SAN MIGUEL	EL DOSIFICADOR OPERA BIEN
2	TENOR No 10 COL. CT.M.	10:30	1.5	14/11/2024	C.T.M.	EL DOSIFICADOR OPERA BIEN
3	LIMONES No 8 FRAC. ARBOLEDAS	10:57	1	14/11/2024	ARBOLEDAS	EL DOSIFICADOR OPERA BIEN
4	VENADO No 10 COL. SAGRADO CORAZON	11:20	1.5	14/11/2024	CALERITA	EL DOSIFICADOR OPERA BIEN
5	MICHOACAN 25-A FRAC. LOS ANGELES	10:01	1	15/11/2024	CASTILLO	EL DOSIFICADOR OPERA BIEN
6	CENTRO DE SALUD	10:20	1	15/11/2024	LA CRUZ	EL DOSIFICADOR OPERA BIEN
7	PLAZA PRINCIPAL No 14 COL. CENTRO	10:41	1	15/11/2024	LA CRUZ	EL DOSIFICADOR OPERA BIEN
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
Metodo DPD						
FIRMAS	OPERADOR					
NOM-127-SSA1-2021 límites cloro libre residual 0.2 a 1.5 mg/L		ING. ADRIAN DE JESUS ALVAREZ ROMO		TIPO DE MANTENIMIENTO / OBSERVACIONES		
FO-CC-02-22 revisión 02		SELLO ORGANISMO OPERADOR		TIPO ALBERCA		

Administración 2024-2027

Administración 2024-2027



Teocaltiche, Jalisco

Teocaltiche, Jalisco

AGUA POTABLE ABRUEBA  
Y ALCANTARILLADO

OBRAS PUBLICAS AUTORIZA

C. ALBERTO AVILA HERNANDEZ

TIPO DE MANTENIMIENTO / OBSERVACIONES

mg/L

TIPO ALBERCA

SELLO SSA

SELLO ORGANISMO OPERADOR



## BITACORA DE MEDICION DE CLORO LIBRE RESIDUAL

**LOCALIDAD: TEOCALTICHE** PERIODO de: **18/11/2024 al 22/11/2024** FOLIO: **047**

No	PUNTO DE MUESTREO	Hora	CLORO LIBRE Mg/L	FECHA	AGUA PROVENIENTE	COMENTARIOS
1	PABLO A RAMIREZ No 260 COL. BELLAVISTA	11:03	1.5	21/11/2024	SAN MIGUEL	EL DOSIFICADOR OPERA BIEN
2	DEL MUSICO No 13 COL. C.T.M.	11:21	0.5	21/11/2024	C.T.M.	EL DOSIFICADOR OPERA BIEN
3	TRUENOS No 12 FRAC. ARBOLEDAS	11:52	2	21/11/2024	ARBOLEDAS	EL DOSIFICADOR OPERA BIEN
4	CANCHA DEPORTIVA SAN JOSE	12:12	1.5	21/11/2024	CALERITA	EL DOSIFICADOR OPERA BIEN
5	GUANAJUATO No 17 FRAC. LOS ANGELES	10:13	1	22/11/2024	CASTILLO	EL DOSIFICADOR OPERA BIEN
6	CENTRO DE SALUD TEOCALTICHE	10:23	0.5	22/11/2024	LA CRUZ	EL DOSIFICADOR OPERA BIEN
7	MERCADO MUNICIPAL	10:46	0.5	22/11/2024	LA CRUZ	EL DOSIFICADOR OPERA BIEN
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						

**Método DPD**

**FIRMAS**

 <b>C. JOSE ALEJANDRO RAMIREZ QUEZADA</b>	 <b>ING. ADRIAN DE JESUS ALVAREZ ROMO</b>
--	--

**OPERADOR** **APRUEBA**

**NOM-127-SSA1-2021 límites cloro libre residual 0.2 a 1.5 mg/L** TIPO DE MANTENIMIENTO / OBSERVACIONES

**TIPO ALBERCA**

SELO ORGANISMO OPERADOR **SELO SSA**




BITACORA DE MEDICION DE CLORO LIBRE RESIDUAL

LOCALIDAD: TEOCALTICHE		PERIODO de: 25/11/2024 al 29/11/2024				FOLIO: 048
No	PUNTO DE MUESTREO	Hora	CLORO LIBRE Mg/L	FECHA	AGUA PROVENIENTE	COMENTARIOS
1	JESUS GARCIA No 10 COL. BELLAVISTA	10:45	2	28/11/2024	SAN MIGUEL	EL DOSIFICADOR OPERA BIEN
2	DEL MUSICO No 24 COL. C.T.M.	11:02	1	28/11/2024	CTM	EL DOSIFICADOR OPERA BIEN
3	CEDROS No 20 FRAC. ARBOLEDAS	11:30	2.5	28/11/2024	ARBOLEDAS	EL DOSIFICADOR OPERA BIEN
4	MONTE SINAI No 11 COL. SAGRADO CORAZON	11:53	0	28/11/2024	CALERITA	MANTENIMIENTO AL CLORADOR
5	AVE JALISCO No 49 FRAC. LOS ANGELES	10:10	1.5	29/11/2024	CASTILLO	EL DOSIFICADOR OPERA BIEN
6	CENTRO DE SALUD COL. CENTRO	10:30	1	29/11/2024	LA CRUZ	EL DOSIFICADOR OPERA BIEN
7	MARCADO MUNICIPAL	10:46	1	29/11/2024	LA CRUZ	EL DOSIFICADOR OPERA BIEN
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						Administración 2024-2027
15						
16						
17						
18						
Metodo DPD						
FIRMAS	OPERADOR <b>C. JOSE ALEJANDRO RAMIREZ QUEZADA</b>		APRUEBA <b>ING. ADRIAN DE JESUS ALVAREZ ROMO</b>			<b>C. ALBERTO AVILA HERNANDEZ</b>
NOM-127-SSA1-2021 límites cloro libre residual 0.2 a 1.5 mg/l						
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO TIPO DE MANTENIMIENTO / OBSERVACIONES						
TIPO ALBERCA						
FO-CC-02-22						
revisión 02						
SELLO ORGANISMO OPERADOR		SELLO SSA				



## CLORACION NOVIEMBRE

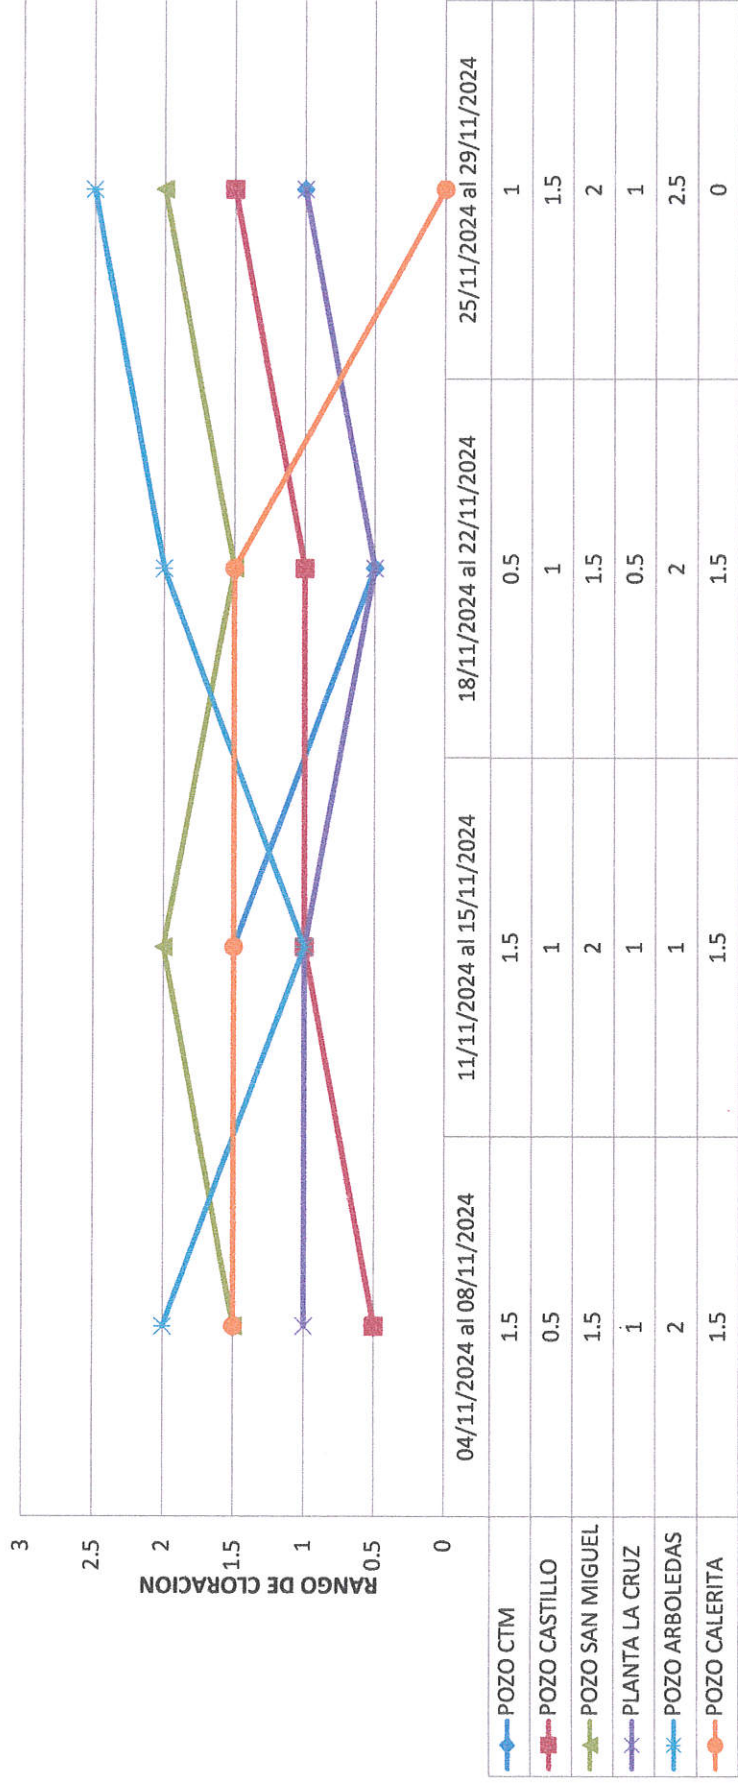

Administración 2024-2027



Teocaltiche, Jalisco  
 AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO


**REPORTE DE PIPAS, SEMANA 04 AL 08 DE NOVIEMBRE 2024**

FECHA	FUENTE DE ABASTECIMIENTO (POZO)	DESTINO	CANTIDAD DE SOLICITUDES ATENDIDAS
04/11/2024	MARAVILLAS	RASTRO MUNICIPAL, AV. JALISCO 58, GUARDIA NACIONAL, PREPARATORIA UDG, COL. SAN MARTIN, SANTA BARBABA	35
05/11/2024	MARAVILLAS	RASTRO MUNICIPAL, COL. EL BARRIO, AV. JALISCO #58, LOC. SANTA BARBARA	28
06/11/2024	MARAVILLAS	GUARDIA NACIONAL, SAN LUIS POTOSI 27, SAN MIGUEL NORTE 123, RASTRO MUNICIPAL, HERRERA I CAIRO 174, INCENDIO AUN COSTADO DE LA PENSION MUNICIPAL, LOC. SANTA BARBARA Y ANALCO.	21
07/11/2024	MARAVILLAS	RASTRO MUNICIPAL, FRACC. LAS LOMAS, HERRERA I CAIRO 193, COL. SAN MARTIN, PUENTE DE CALDERON #5, LOPEZ COTILLA #499, ANALCO, PANTEON MUNICIPAL, AV. LOS ARCOS	32
08/11/2024	MARAVILLAS	RASTRO MUNICIPAL, GUARDIA NACIONAL, PREPARATORIA UDG, VICENTENARIO 392, RANCHO LAS CUQUIS, NIÑOS HEROES 736, PROL. NIÑOS HEROES 1387, COL. SAN MARTIN, INSTALACIONES DE LA FERIA, HERRERA I CAIRO 174. JUSTO SIERRA 73	17
<b>TOTAL</b>			<b>133</b>

Administración Municipal de Agua Potable y Alcantarillado  
2024-2027


**RECIBIDO**

12:28 p.m.  
14 NOV. 2024





## REPORTE DE PIPAS, SEMANA 11 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2024



ESTADO DE JALISCO

FECHA	FUENTE DE ABASTECIMIENTO (POZO)	DESTINO	CANTIDAD DE SOLICITUDES ATENDIDAS
11/11/2024	MARAVILLAS	GUARDIA NACIONAL	1
12/11/2024	MARAVILLAS	DIA INHABIL	0
13/11/2024	MARAVILLAS	RASTRO MUNICIPAL, COL. EL PUENTE, LOC. ANALCO Y MAZCUA, GUARDIA NACIONAL, PREPARATORIA UDG, NIÑOS HEROES 731, 122, 188, PROL. HIDALGO 650, COL. SAN PEDRO, JORDAN 66-A,	34
14/11/2024	MARAVILLAS	RASTRO MUNICIPAL CONSTITUCIONALISTAS 74, LOPEZ COTILLA 499 Y 600, COL. EL PUENTE, JUSTO SIERRA #73 Y 57, JERICO # 49, GALILEA #10-A, SOLDADOS, MAZCUA.	29
15/11/2024	MARAVILLAS	GUARDIA NACIONAL, RASTRO MUNICIPAL, PREPARATORIA UDG, COL. EL BARRIO, MAZCUA, SANTABARBARA.	33
			97

Administración 2024-2027

**RECIBIDO**

33

21 NOV. 2024

97

Teocaltiche, Jalisco  
OBRAS PUBLICAS




Teocaltiche, Jalisco  
AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO






## REPORTE DE PIPAS, SEMANA 18 AL 22 DE NOVIEMBRE 2024



FECHA	FUENTE DE ABASTECIMIENTO (POZO)	DESTINO	CANTIDAD DE SOLICITUDES ATENDIDAS
18/11/2024	MARAVILLAS	GUARDIA NACIONAL.	1
19/11/2024	MARAVILLAS	PREPARATORIA UDG , PROL. HIDALGO 962, RASTRO MUNICIPAL, KINDER TEPOCHCALLI, PIPILA #1, CERRO DE LOS GREGORIOS #13, LIBRAMIENTO CARRETERO,CAMELLONES, SANTA BARBARA.	29
20/11/2024	MARAVILLAS	PREPARATORIA UDG, LOMA DEL DEPORTE S/N, RASTRO MUNICIPAL, PROL. HIDALGO 960, HERRERA I CAIRO 193, SANTA BARBARA, LOPEZ COTILLA 499, AV. TEOCALTICHE 98, COMANDANCIA MUNICIPAL.	38
21/11/2024	MARAVILLAS	PREPARATORIA UDG, COL EL BARRIO, RASTRO MUNICIPAL, HERRERA I CAIRO 183, SANTA BARBARA, JUAN PEZA #225, CAMELLONES.	35
22/11/2024	MARAVILLAS	GUARDIA NACIONAL, LOMA DE LA VISTA 21, LOMA VERDE #8, RASTRO MUNICIPAL, LIC FRANCISCO RODRIGUEZ GOMEZ 180.	5
24/11/2024	MARAVILLAS	GUARDIA NACIONAL, MOCTEZUMA SUR #485. Administración 2024-2027	2
<b>TOTAL</b>			<b>110</b>

**RECIBIDO**  
2:19 p.m.  
25 NOV. 2024  
Teocaltiche, Jalisco  
OBRAS PUBLICAS



Teocaltiche, Jalisco  
AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO



REPORTE DE PIPAS, SEMANA 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024



FECHA	FUENTE DE ABASTECIMIENTO (POZO)	DESTINO	CANTIDAD DE SOLICITUDES ATENDIDAS
29/11/2024	MARAVILLAS	BASURERO, LOPEZ COTILLA #600, JUSTO SIERRA 6,7, 9, LOPEZ COTILLA #375-A, PROL. HIDALGO 948, GUARDIA NACIONAL, PREPARATORIA UDG, RASTRO MUNICIPAL, SANTA BARBARA.	31
29/11/2024	MARAVILLAS	RASTRO MUNICIPAL, BASURERO MUNICIPAL, APOLONIO MORENO #2 Y 78, COL. EL BARRIO, LOC. SANTA BARBARA.	34
29/11/2024	MARAVILLAS	SOLDADOS, RASTRO MUNICIPAL, DONATO GUERRA #639,655 Y 657, DIO. FRANCISCO RODRIGUEZ GOMEZ #208 GUARDIA NACIONAL, UDG, JUVENTINO ROSAS #14, PROL. HIDALGO 960 Y 962, LOMA DE LA VISTA #21, LOC. SANTA BARBARA.	32
29/11/2024	MARAVILLAS	SOLDADOS, RASTRO MUNICIPAL, ABASOLO 112, 123, 116, 107, 121, MARIANO ALDAMA, NIÑOS HEROES 650, DONATO GUERRA 588, LOMA DEL DEPORTE S/N, LOMA DE LA VISTA 32, LOC. MAZCUA.	32
29/11/2024	MARAVILLAS	RASTRO MUNICIPAL, GUARDIA NACIONAL, PREPARATORIA UDG, CAMPO DE BEISBOL LAS FLORES, LOMA DEL PAISAJE, CALLE LA ROSA, LOC. ANALCO	30
<b>TOTAL</b>			<b>159</b>

Administración 2024-2027

RECIBIDO

2:32 p.m.  
U 2 DIC. 2024



Teocalitche, Jalisco  
AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO

Teocalitche, Jalisco  
OBRAS PÚBLICAS
